



Управление проектами.
Завершение.

- Проект — это **временное** предприятие, направленное на создание **уникального продукта**, услуги или результата.
 - есть начало и окончание.
 - окончание наступает, когда его цели достигнуты/не будут/не могут быть достигнуты/в проекте больше нет необходимости.
- Управление проектом — это приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту.
Управление проектом осуществляется посредством надлежащего применения и интеграции процессов управления проектом, установленных для данного проекта.

Управление проектом включает в себя, среди прочего:

- выявление требований к проекту;
- реагирование на различные потребности, затруднения и ожидания заинтересованных сторон;
- установление и поддержание активных коммуникаций с заинтересованными сторонами;
- управление ресурсами;
- уравнивание конкурирующих ограничений проекта, которые включают в себя, среди прочего:
 - **содержание,**
 - **расписание,**
 - **стоимость,**
 - качество,
 - ресурсы,
 - риски.


Условия конкретного проекта влияют на то, как реализуется каждый процесс управления проектом, а также как приоритизируются ограничения проекта.

Жизненный цикл проекта

- Жизненный цикл проекта — это набор фаз, через которые проходит проект с момента его начала до момента завершения.
- Фаза проекта — совокупность логически связанных операций проекта, завершающихся достижением одного или ряда поставляемых результатов.
- Фазы проекта могут быть последовательными, итеративными или накладывающимися друг на друга.
- Названия, количество и продолжительность фаз проекта определяются в зависимости от потребностей в управлении и контроле организаций, вовлеченных в проект, характера самого проекта и его прикладной области.

Хотя проекты отличаются размером и степенью сложности своего состава, структуру жизненного цикла типичного проекта можно представить в следующем виде

- начало проекта;
- организация и подготовка;
- выполнение работ;
- мониторинг и контроль ра
- завершение проекта

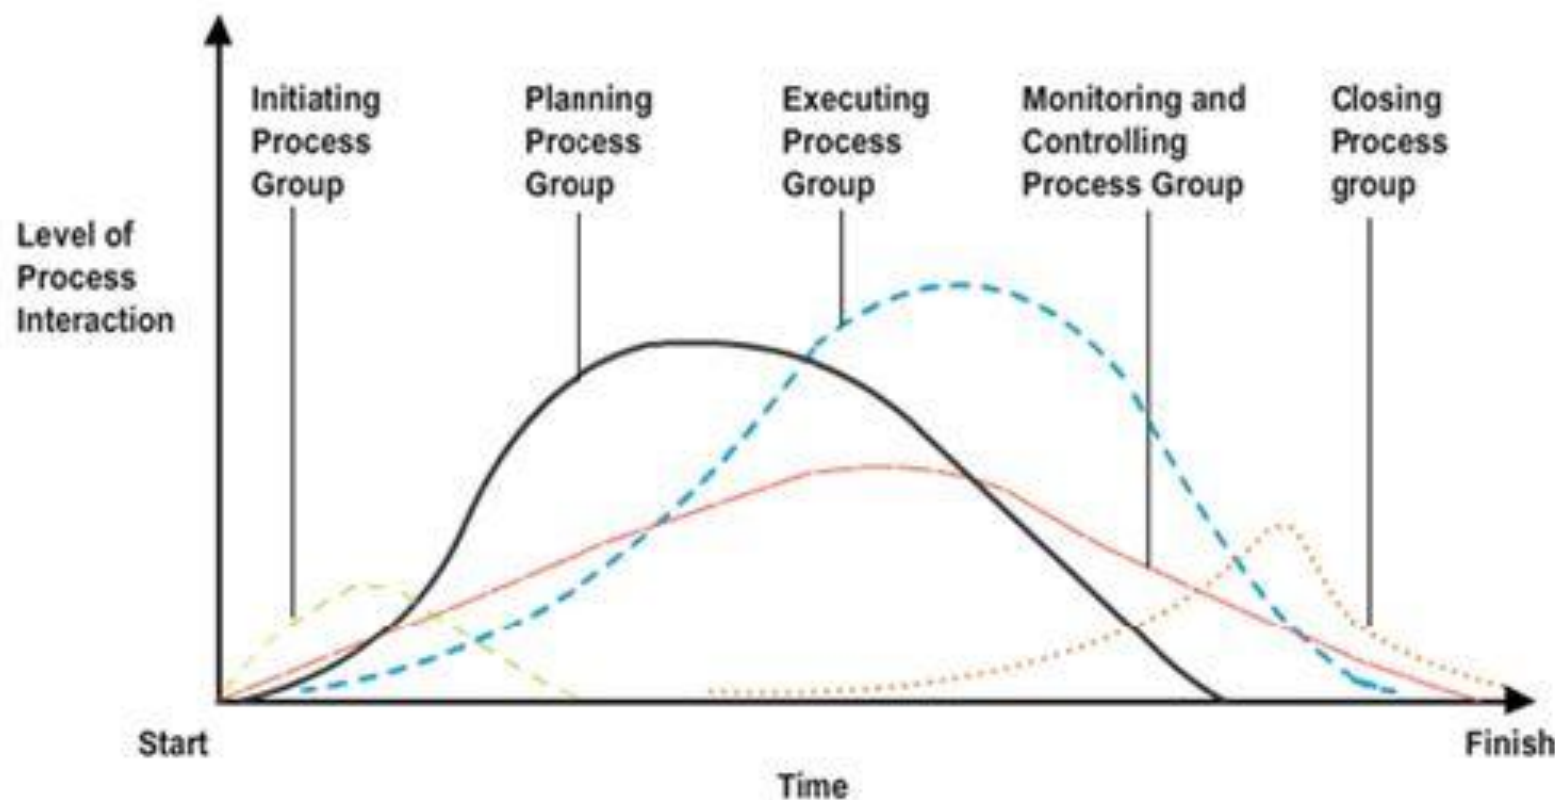

Заинтересованные стороны проекта

- Заинтересованная сторона — это лицо, группа или организация, которая может влиять, на которую могут повлиять или которая может воспринимать себя подвергнутой влиянию решения, операции или результата проекта.
- Заинтересованные стороны могут быть внешними или внутренними по отношению к проекту, могут участвовать в нем активно, неактивно или вообще о нем не знать.
- Заинтересованные стороны могут оказывать положительное или отрицательное воздействие на проект, или подвергаться положительному или отрицательному воздействию от проекта.



Внутренние заинтересованные стороны:

- спонсор,
- руководитель ресурсов,
- офис управления проектами (РМО),
- менеджер проекта,
- руководители других проектов,
- члены команды.

Внешние заинтересованные стороны:

- заказчики,
- конечные пользователи,
- поставщики,
- акционеры,
- регулирующие органы,
- конкуренты.



Роль руководителя проекта

- Руководитель проекта — это лицо, назначенное исполняющей организацией руководить командой, **ответственной за достижение целей проекта**. Отношения подчиненности руководителя проекта зависят от организационной структуры и руководства проектом.
- От квалификации проектного менеджера зависит, насколько успешно и грамотно ведется проект:
 - знания в области **управления проектом**, знание деловой среды, технических вопросов;
 - навыки, необходимые для **управления командой** проекта, координации работ, взаимодействия с заинтересованными сторонами, разрешения проблем и принятия решений;
 - способность к разработке и управлению **содержанием, расписанием, бюджетами**, ресурсами, рисками, планами, презентациями и отчетностью;
 - другие качества, такие как характер, отношение к работе, **моральные качества и лидерство**.



Руководители проекта используют в работе навыки межличностных отношений, включая, среди прочего, следующие:

- лидерство
- укрепление команды
- мотивация
- общение
- влияние
- принятие решений
- политическая и культурная осведомленность
- ведение переговоров
- фасилитация (организация групповой работы)
- умение разрешать конфликты
- коучинг

Проект можно считать **успешным**, если были **достигнуты цели проекта**.

Еще одним критерием успеха является **удовлетворенность заинтересованных сторон**.

Области знаний управления проектом

- Управление интеграцией проекта
- Управление содержанием проекта
- Управление расписанием проекта
- Управление стоимостью проекта
- Управление качеством проекта
- Управление ресурсами проекта.
- Управление коммуникациями проекта
- Управление рисками проекта
- Управление закупками проекта
- Управление заинтересованными сторонами проекта



PROCESS GROUP AND KNOWLEDGE AREA MAPPING

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating	Planning	Executing	Monitoring and Controlling	Closing
4. Project Integration Management	4.1 Develop Project Charter	4.2 Develop Project Management Plan	4.3 Direct and Manage Project Work 4.4 Manage Project Knowledge	4.5 Monitor and Control Project Work 4.6 Perform Integrated Change Control	4.7 Close Project or Phase
5. Project Scope Management		5.1 Plan Scope Management 5.2 Collect Requirements 5.3 Define Scope 5.4 Create WBS		5.5 Validate Scope 5.6 Control Scope	
6. Project Schedule Management		6.1 Plan Schedule Management 6.2 Define Activities 6.3 Sequence Activities 6.4 Estimate Activity Durations 6.5 Develop Schedule		6.6 Control Schedule	
7. Project Cost Management		7.1 Plan Cost Management 7.2 Estimate Costs 7.3 Determine Budget		7.4 Control Costs	
8. Project Quality Management		8.1 Plan Quality Management	8.2 Manage Quality	8.3 Control Quality	
9. Project Resource Management		9.1 Plan Resource Management 9.2 Estimate Activity Resources	9.3 Acquire Resources 9.4 Develop Team 9.5 Manage Team	9.6 Control Resources	
10. Project Communications Management		10.1 Plan Communications Management	10.2 Manage Communications	10.3 Monitor Communications	
11. Project Risk Management		11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risks 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses	11.6 Implement Risk Responses	11.7 Monitor Risks	
12. Project Procurement Management		12.1 Plan Procurement Management	12.2 Conduct Procurements	12.3 Control Procurements	
13. Project Stakeholder Management	13.1 Identify Stakeholders	13.2 Plan Stakeholder Engagement	13.3 Manage Stakeholder Engagement	13.4 Monitor Stakeholder Engagement	

Группы процессов управления проектом

Процессы управления проектом сгруппированы в пять групп процессов управления проектом:

- **Группа процессов инициации.** Процессы, выполняемые для определения нового проекта или новой фазы существующего проекта путем получения авторизации на начало проекта или фазы.
- **Группа процессов планирования.** Процессы, требуемые для установления содержания проекта, уточнения целей и определения направления действий, требуемых для достижения целей проекта.
- **Группа процессов исполнения.** Процессы, выполняемые для исполнения работ, указанных в плане управления проектом, с целью соответствия требованиям проекта.
- **Группа процессов мониторинга и контроля.** Процессы, требуемые для отслеживания, анализа, а также регулирования исполнения проекта; выявления областей, требующих внесения изменений в план; и инициирования соответствующих изменений.
- **Группа процессов закрытия.** Процессы, выполняемые для формального завершения или закрытия проекта, фазы или договора.

Группа процессов инициации:

- Разработка устава проекта
- Идентификация заинтересованных сторон
- План управления проектом (драфт-версия)

Группа процессов планирования

- Разработка плана управления проектом
- Планирование управления содержанием
- Сбор требований
- Определение содержания
- Создание WBS
- Планирование управления расписанием
- Определение операций
- Определение последовательности операций
- Оценка длительности операций
- Разработка расписания
- Планирование управления стоимостью
- Оценка стоимости
- Определение бюджета
- Планирование управления качеством
- Планирование управления ресурсами
- Оценка ресурсов операций
- Планирование управления коммуникациями
- Планирование управления рисками
- Идентификация рисков
- Качественный анализ рисков
- Количественный анализ рисков
- Планирование реагирования на риски
- Планирование управления закупками
- Планирование вовлечения заинтересованных сторон

Группа процессов исполнения


- Руководство и управление работами проекта
- Управление знаниями проекта
- Управление качеством
- Приобретение ресурсов
- Развитие команды проекта
- Управление командой проекта
- Управление коммуникациями
- Осуществление реагирования на риски
- Проведение закупок
- Управление вовлечением заинтересованных сторон

Группа процессов мониторинга и контроля

- Мониторинг и контроль работ проекта
- Интегрированный контроль изменений
- Подтверждение содержания
- Контроль расписания
- Контроль стоимости
- Контроль качества
- Контроль ресурсов
- Мониторинг коммуникаций
- Мониторинг рисков
- Контроль закупок
- Мониторинг вовлечения заинтересованных сторон

Группа процессов закрытия

- Группа процессов закрытия включает процессы, выполняемые для формального завершения или закрытия проекта, фазы или договора;
- проверяет, что **процессы**, определенные в рамках всех групп процессов, **выполнены необходимым образом** для закрытия проекта или фазы, и формально устанавливает, что проект или фаза проекта завершена.

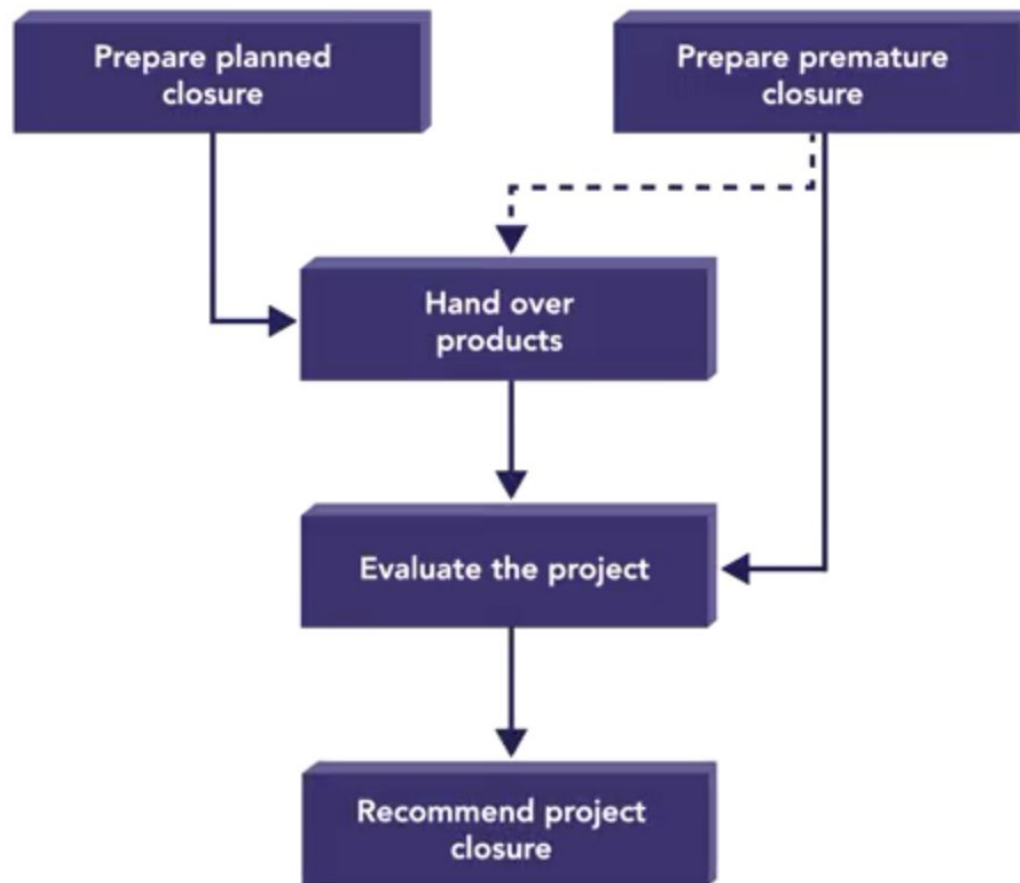

Based on AXELOS PRINCE2® material. Reproduced under license from AXELOS Limited. All rights reserved.

1. Проверить **критерии завершения** или выхода для фазы или проекта:

- все **документы и поставляемые результаты являются актуальными** и все проблемы урегулированы;
- подтверждена поставка и **формальная приемка** поставляемых результатов заказчиком;
- команда освобождена от проекта;
- решен вопрос об использовании избыточных материалов проекта;
- подготовлена итоговая отчетность проекта в соответствии с требованиями политики организации.

2. Завершите **договорные соглашения**,
относящихся к проекту или фазам проекта:

- формальная приемка работ **вендоров**
- окончательное урегулирование **претензий**




3. Соберите информацию:

- документацию проекта или фазы проекта. И **заархивируйте** её
- проведите аудит (успех или неудача проекта)
- определите **извлеченные уроки** (lessons learnt)
- сделайте итоговый отчет



Итоговый отчет

- цели содержания, использованные критерии для оценки содержания и доказательства того, что критерии завершения проекта были соблюдены
- цели по качеству...
- цели по стоимости...
- цели расписания...
- информация о готовом продукте, услуге или результате. Удовлетворили ли они бизнес потребности
- информация о рисках и проблемах, с которыми пришлось столкнуться в ходе осуществления проекта, и какие меры были приняты для их устранения

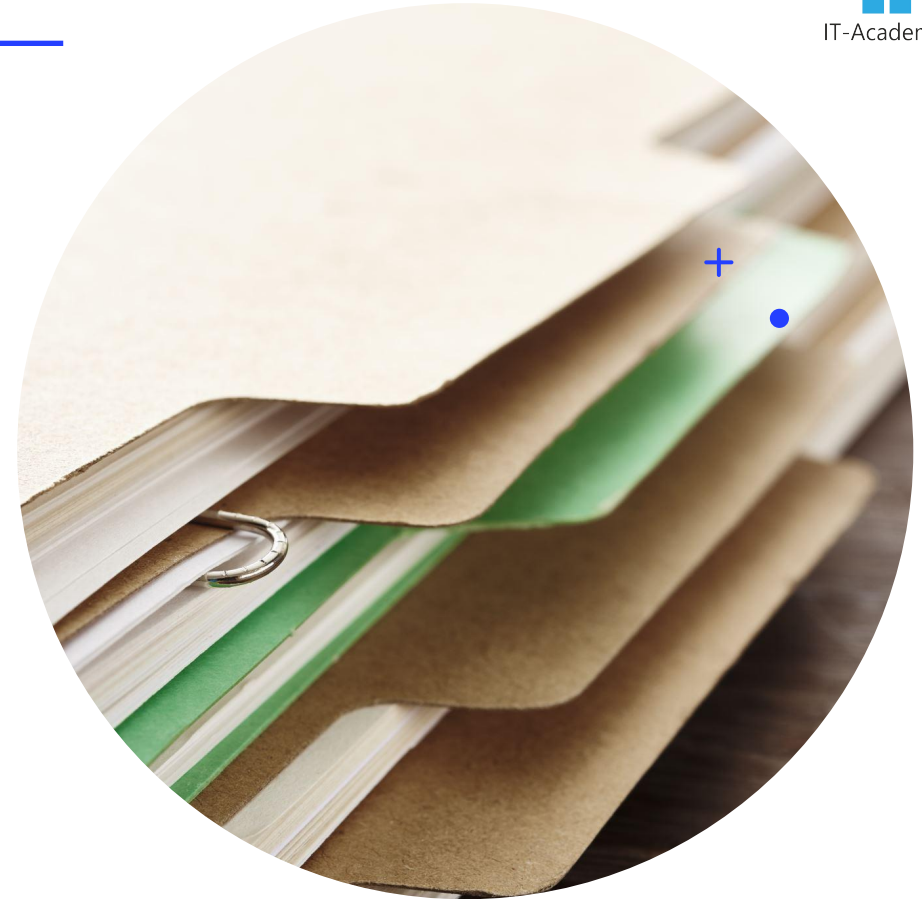



Project Closeout Report

Project Name	NMDWS IT Security Initiatives 06	Date	7/23/09
Executive Sponsor	NMDWS - CIO	Lead Agency	NMDWS
Project Manager	Art Montoya	Agency Code	631

PROJECT DESCRIPTION (PROVIDE A BRIEF DESCRIPTION AND PURPOSE FOR THIS PROJECT)
NMDWS took initiative to request and obtain funding via Supplemental Budget Request from the US Dept. of Labor for several Information System Security Initiatives. The security projects undertaken were to address many areas of risk discovered in self assessments within NMDWS and, to take measures to mitigate key security concerns. (Total approved \$315,221.00, total utilized \$220,268.96). Listed below are five SBR's received and the initiatives taken by NMDWS in 2006. • IS Security Assessment: The SBR funding provided to NMDWS was used for two Information Systems Security related projects. 1. Conduct an Information Systems Security Assessment – By Federal (USDOL) Requirements, NMDWS is required to have an independent IT Audit performed to identify risks and vulnerabilities within the Unemployment Insurance (UI) application. (\$30,000 – Service provided by the NM Tech CANNES Group) 2. Development of IT Unemployment Claims Auditing Application – Application was developed to provide auditing capabilities for the UI Internal audit staff to monitor UI business transactions as mandated by USDOL requirements. (\$70,000 – Application developed/implemented by TekSystems Inc.) • Security Training: Security Training was greatly deficient within New Mexico State Gov't. In most instances, security staff were moved over from the IS networking departments whom lacked the specialized training to implement a security program. NMDWS was no exception to this lack of training. Training was on-going from October 2006 through expiration of SBR funding Sept. 30, 2008. Training included technical security methodology, Security Auditing methodology and others. (Approved for \$89,140.00 utilized \$65,642.00 through a variety of training sources.) • Intrusion Detection: The SBR was utilized to purchase a Tipping Point Intrusion Detection/Prevention Appliance. The purpose of the Tipping Point product is to reduce/eliminate suspicion data transfers (peer to peer protocols, virus signatures, on-line game protocols, etc.) (Approved for \$45,731.00 utilized \$42,741.00) • Encryption/Network Assessment Software: Purchase and installation of NMDWS network assessment application (LanGuard). Software used for scanning of IS Network hardware resources and risk assessment. WebInspect software was replaced with Mobile Armor Encryption software and installation. (Approved for \$32,250.00 utilized \$11,885.96) • Voice over IP Pilot Project: Project was not implemented. Project was designed to establish a pilot/proof of concept of a Voice over IP/ toll by-pass service to Unemployment Insurance claimants in remote locations. This project was planned to provide two cost saving services. 1. To eliminate long distance charges to UI Claimants in remote locations and, secondly to reduce cost of phone services from remote locations. (Approved for \$48,100)

Schedule and Budget			
Planned Start Date	9/7/2006	Actual Start Date	Oct 2, 2006
Planned End Date	6/30/2008	Actual End Date	4/30/2009
Planned Cost: (Budget)	\$315,221.00	Actual Cost: (Total)	\$220,268.96
▪ Professional Services	\$100,000.00	▪ Professional Services	\$100,000.00
▪ Hardware	\$45,731.00	▪ Hardware	\$42,741.00

Project Closeout Report

Оценка проекта при закрытии

Заполняется Лицом, ответственным за качество проекта на этапе завершения проекта.

Соответствие продукта проекта		1.	<начальный продукт>	<Сделан / сделан измененный / не сделан / новый / отменен>
		2.		
		3.		
		4.		
Т Р У Д О З А Т Р А Т Ы	Dev		<начальная оценка>	<реальные трудозатраты>
	Testing		<начальная оценка>	<реальные трудозатраты>
	PM		<начальная оценка>	<реальные трудозатраты>
	Design		<начальная оценка>	<реальные трудозатраты>
	Others		<начальная оценка>	<реальные трудозатраты>
	ИТОГО:		<начальная оценка>	<реальные трудозатраты>
Оценка своевременности			<начальная дата поставки>	<реальная дата поставки>
Дополнительные показатели проекта				
Оценка успешности проекта		1.	Проект сдан в срок	<Выполнено / частично выполнено / не достигнуто>
		2.	Проект сдан в бюджет	<Выполнено / частично выполнено / не достигнуто>
		3.	По спецификации	<Выполнено / частично выполнено / не достигнуто>
		4.	Выполнен прием продуктов проекта в течение 1 недели после сдачи проекта	<Выполнено / частично выполнено / не достигнуто>
		5.		
		6.		
Оценка действий руководителя проекта		<Внести собранные за период хода проекта замечания. Достаточно обработать все замечания, полученные на ретроспективах>		
Оценка действий субподрядчиков		<Перечень всех существовавших задержек и их влияние на срок реализации, предпринятые для коррекции сроков действия руководителя>		
Дополнительная информация по закрытию проекта (Что было хорошо, Что было плохо, Что хотелось бы улучшить)				

Project Closeout Report
(start with simple)

Анализ полученных уроков

Lessons Learned

Под полученными уроками понимают опыт, накопленный в ходе реализации проекта:

- трудности, с которыми пришлось столкнуться
- непредвиденные ситуации и риски
- проблемы, которые неизбежно возникают при следовании плану проекта
- провалы планирования
- решения и действия, не принесшие должных результатов
- успешные решения и дополнения к проекту
- возможные способы повышения результативности проекта



Что сделать дома

- [How and Why to Close a Project - Project Management Training](#)
- [How to Capture Lessons Learned at the End of a Project](#)
- [Project closing the small process group with big impact](#)
