

Discovery phase and Project Initiation





Project Stages

Продажа и заключение контракта (RFX)

RFX - это opportunity от отдела продаж или аккаунт менеджера

- ❖ RFI - request for information
- ❖ RFQ - request for quotation
- ❖ RFP - request for proposal
- ❖ RFQ - request for qualifications

RFI – Request for Information

- ❖ запрос на информацию
- ❖ от организации, которая хочет приобрести товары или услуги.
- ❖ собирает информацию от различных поставщиков.
- ❖ запрос в определенном структурированный формате

RFQ – Request for Quotation

- ❖ запрос на цены (расценки)
- ❖ от организации, которая хочет приобрести товар/услугу/сервис
- ❖ содержит спецификацию, чтобы получить и сравнить ценовые предложения.
- ❖ не оформленное коммерческое предложение со стороны покупателя, а просто запрос.

RFP – Request for Proposal

- ❖ запрос на коммерческое предложение
- ❖ от организации, которая хочет приобрести продукт или услугу,
- ❖ но требуется полное или частичное участие поставщика в разработке.
- ❖ не предложение со стороны фирмы-покупателя, но пока только запрос относительно доступности, цены и возможности разработки чего-либо по заказу потенциального покупателя.

RFQ - Request for Qualifications

- ❖ запрос квалификации
- ❖ часто идет перед RFP
- ❖ сужает круг кандидатов с необходимой квалификацией

Pre-sale

Команда для оценки opportunity:

- ❖ *Координатор* (rfx manager), часто в роли Аналитика. Если проект крупный - подключаем бизнес-аналитика.
- ❖ *Разработчик* с опытом оценки проектов. Каждую из частей системы оценивает свой разработчик
- ❖ *Тестировщик* для прояснения плана тестирования, типов тестирования, необходимости автоматизации.
- ❖ *Архитектор* (Solution Architect) на крупных, технически сложных и стратегически важных проектах.

Что нужно учесть в RFP

- ❖ есть задачи на развертывание и настройку всех окружений
- ❖ учтено время команды на коммуникацию.
- ❖ есть все изначальные допущения (assumptions). Они обоснованы и не избыточны
- ❖ указан список поддерживаемых платформ, ОС, браузеров и т.д.
- ❖ указано наличие поддержки языков
- ❖ в WBS нет задач длительностью более 40 часов
- ❖ учтены риски интеграций со сторонними системами
- ❖ в оценку и календарный план проекта заложен временной буфер

На основании этих данных формируется Project Vision/Solution Vision и Vendor's commercial proposal

Discovery phase



when you need to explore

Why?

Reasons, goals

Who?


People, things, organization.
Users

What?

Facts and opinions

Where?

Location

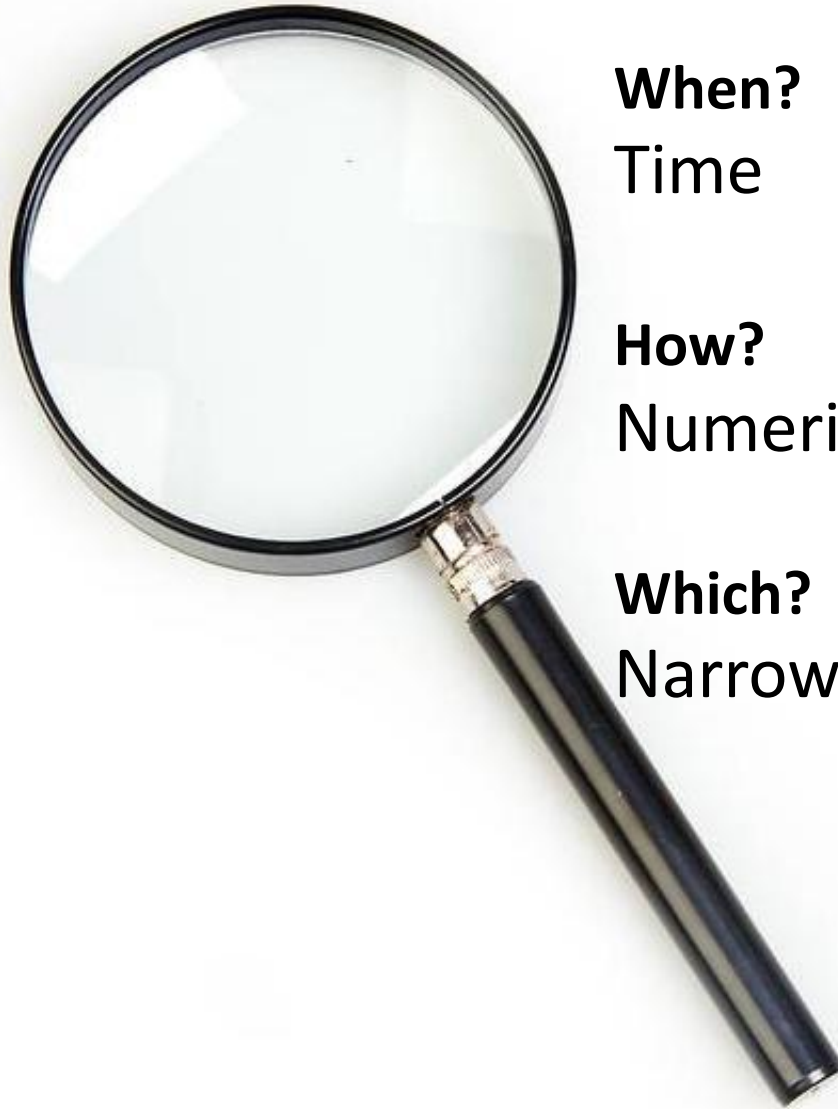

When?

Time

How?

Numerical data

Which?

Narrowing questions


Work Breakdown Structure/ Иерархическая Структура Работ

*разбиение проекта на конкретные **результаты**,
которые должны быть достигнуты для достижения целей проекта.*

Принципы WBS:

- ❖ 100% Rule
- ❖ Deliverables, Not Actions
- ❖ Mutual exclusivity
- ❖ Reasonable Level of Details



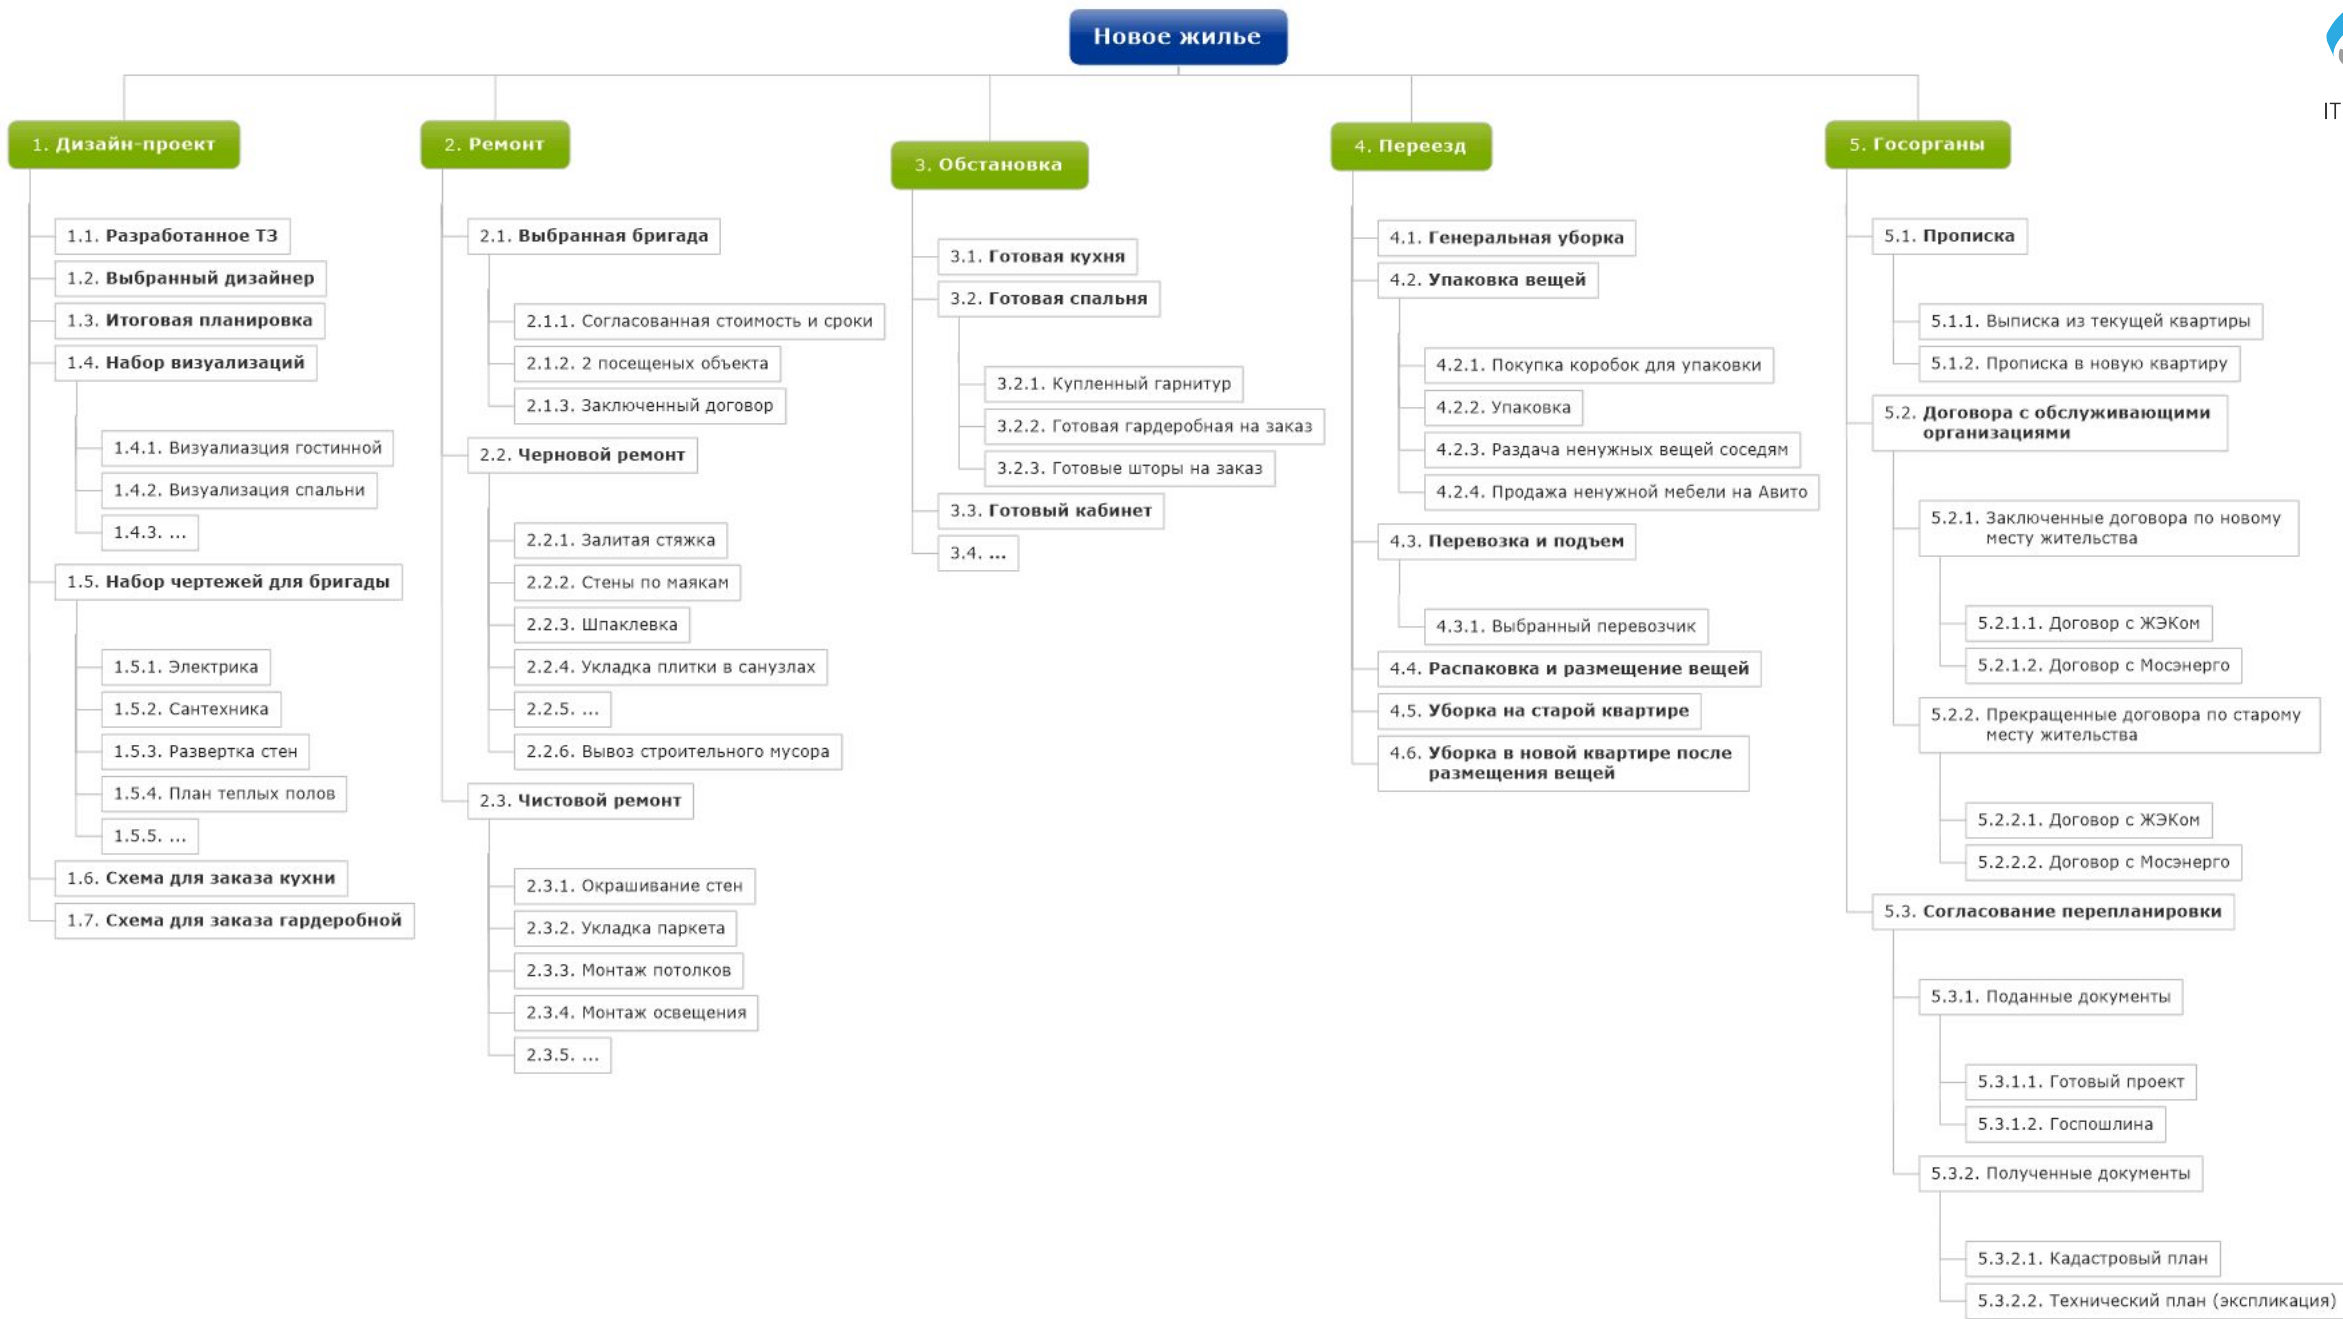

Чем хороша WBS?

- ❖ весь объем проекта
- ❖ фокусирует на результате
- ❖ синхронизация заказчика и команды
- ❖ помогает обосновать финансовые и человеческие ресурсы
- ❖ помогает определить риски
- ❖ помогает выделить контрольные точки



Группировка и декомпозиция WBS

- ❖ По стадиям жизненного цикла проекта
- ❖ По высокоуровневым результатам проекта
- ❖ По организационной структуре
- ❖ По срокам
- ❖ По техническим областям
- ❖ По источникам финансирования



Устав проекта

PMBOK:

Устав проекта - это документ, выпущенный *инициатором или спонсором* проекта, который формально *авторизует* существование проекта и предоставляет руководителю проекта *полномочия* использовать ресурсы организации в операциях проекта.



Разделы устава

1. **Назначение или обоснование проекта (project purpose)**, т.е. для чего и зачем инициируется данный проект.

Проект запускается если есть:

- потребность рынка
- производственная необходимость
- потребность заказчика
- технический прогресс
- юридические ограничения или нормы
- общественная потребность
- или подобное




Разделы устава

2. Измеримые цели проекта (project goals)
и соответствующие критерии успеха -
раздел, в котором описываются способы
измерения результаты проекта.



При постановке целей удобно пользоваться технологией целеполагания SMART (1954, Питер Друкер), согласно которой любая цель должна быть:

- **S**pecific (конкретной)
- **M**easurable (измеримой)
- **A**ttainable (достижимой)
- **R**elevant (уместной)
- **T**ime-bound (определенной во времени)

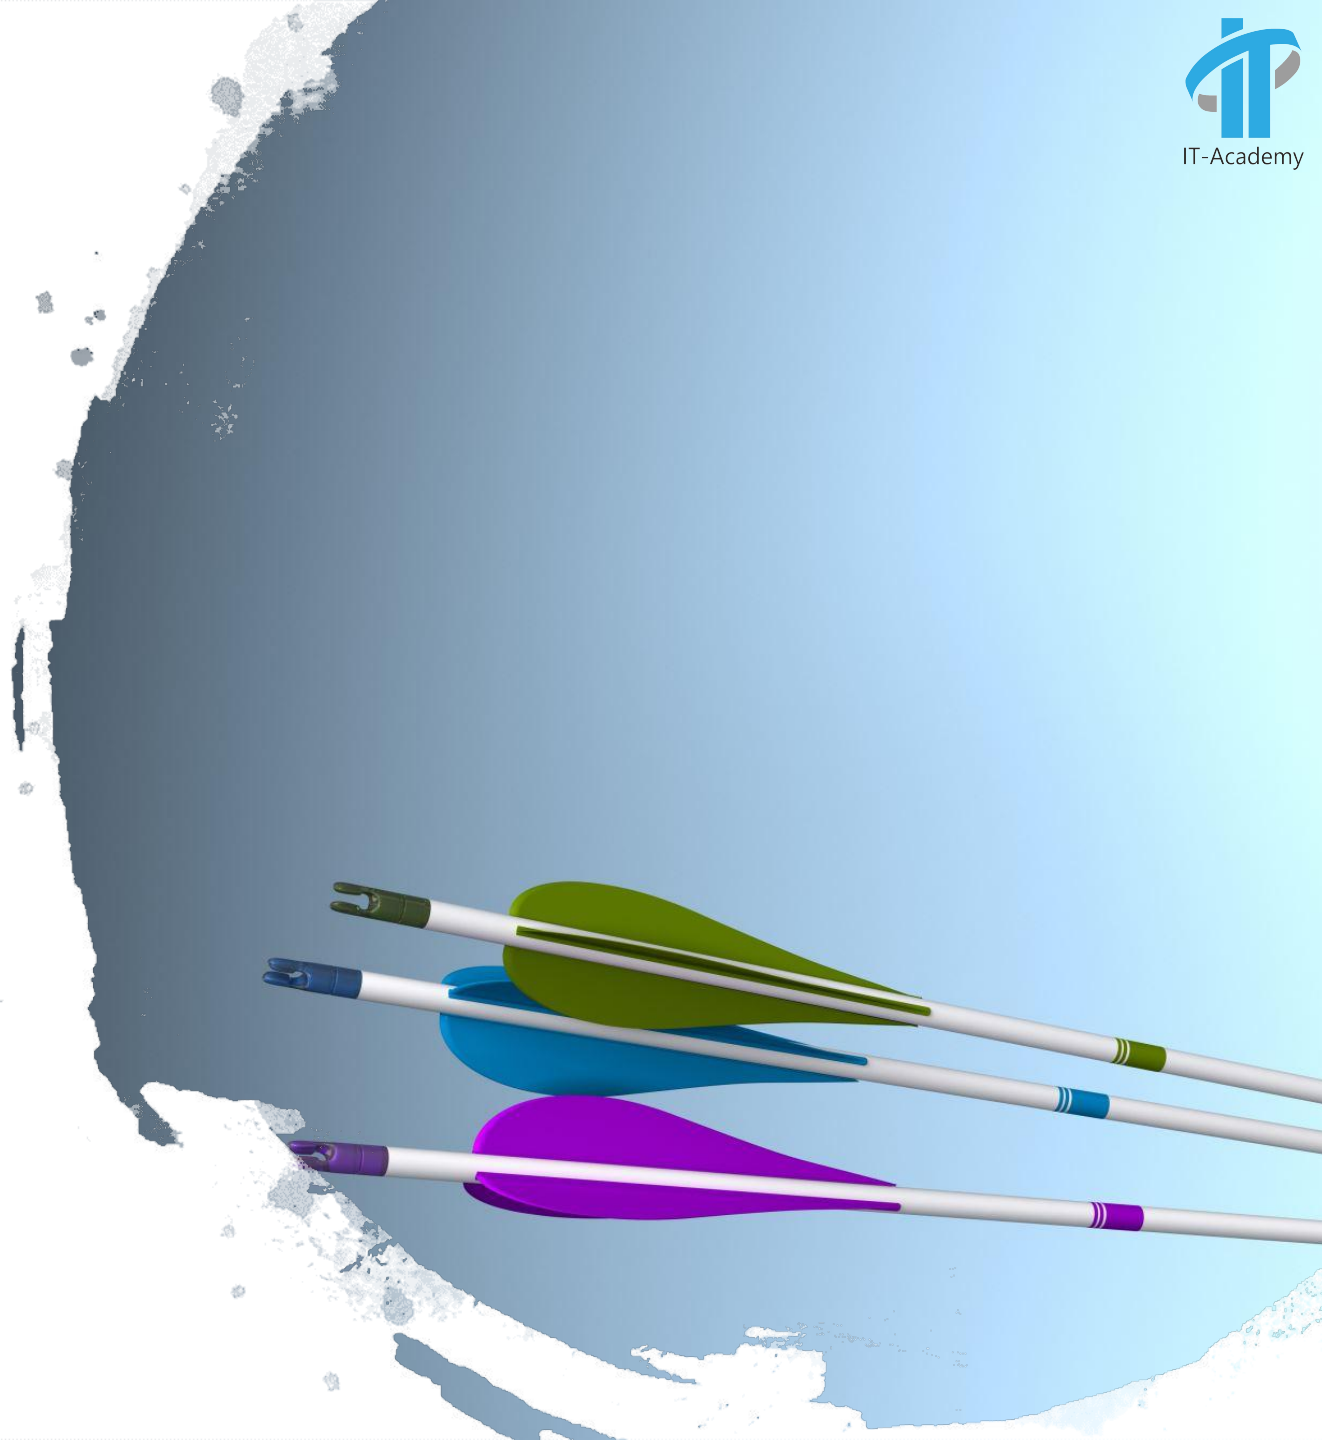



S

Specific

Who, What, Where,
When, Why, Which

Define the goal as much
as possible with no
ambiguous language.

WHO is involved, WHAT
do I want to accomplish,
WHERE will it be done,
WHY am I doing this
(reasons, purpose),
WHICH constraints /
requirements do I have?



M

Measurable

From and To

Can you track the
progress and measure
the outcome?

How much, how many,
how will I know when
my goal is
accomplished?



A

Attainable

How

Is the goal reasonable
enough to be
accomplished? How so?

Make sure the goal is
not out of reach or
below standard
performance.



R

Relevant

Worthwhile

Is the goal worthwhile
and will it meet your
needs?

Is each goal consistent
with other goals you
have established and
fits with your
immediate and long
term plans?



T

Timely

When

Your objective should
include a time limit. "I
will complete this step
by month/day/year."


It will establish a sense
of urgency and prompt
you to have better time
management.

Пример:

Увеличить трафик поисковой системы на 10% за два месяца

- Конкретная: увеличить посещаемость поисковой системы на 10% в течение двух месяцев
- Измеримая: последовательно оптимизировать пять лучших частей контента, чтобы усовершенствовать их, обеспечить 10 высококачественных обратных ссылок на этот контент
- Достижимая: проектная команда знакома с такого рода работой
- Актуальная: трафик с поисковых систем является наиболее ценным источником трафика в нашем бизнесе. Этот план – лучший способ увеличения органического трафика, поэтому достижение нашей цели напрямую приведет нас к успеху.
- Ограниченная во времени: проект рассчитан на два месяца

Увеличить трафик с поисковых систем на 10% за два месяца, сосредоточившись на повторной оптимизации существующего контента, получив 10 высококачественных обратных ссылок на этот контент.




Практика

Составить как минимум 3 цели по SMART
для проектов-примеров



3. Высокоуровневые требования (high level requirements, scope), удовлетворяющие потребности, пожелания и ожидания заинтересованных лиц.

- на что должны быть направлены работы
- какую стратегическую позицию следует занять
- какую задачу следует решить
- какой результат нужно достичь
- какой требуется произвести продукт
- или какую услугу необходимо оказать

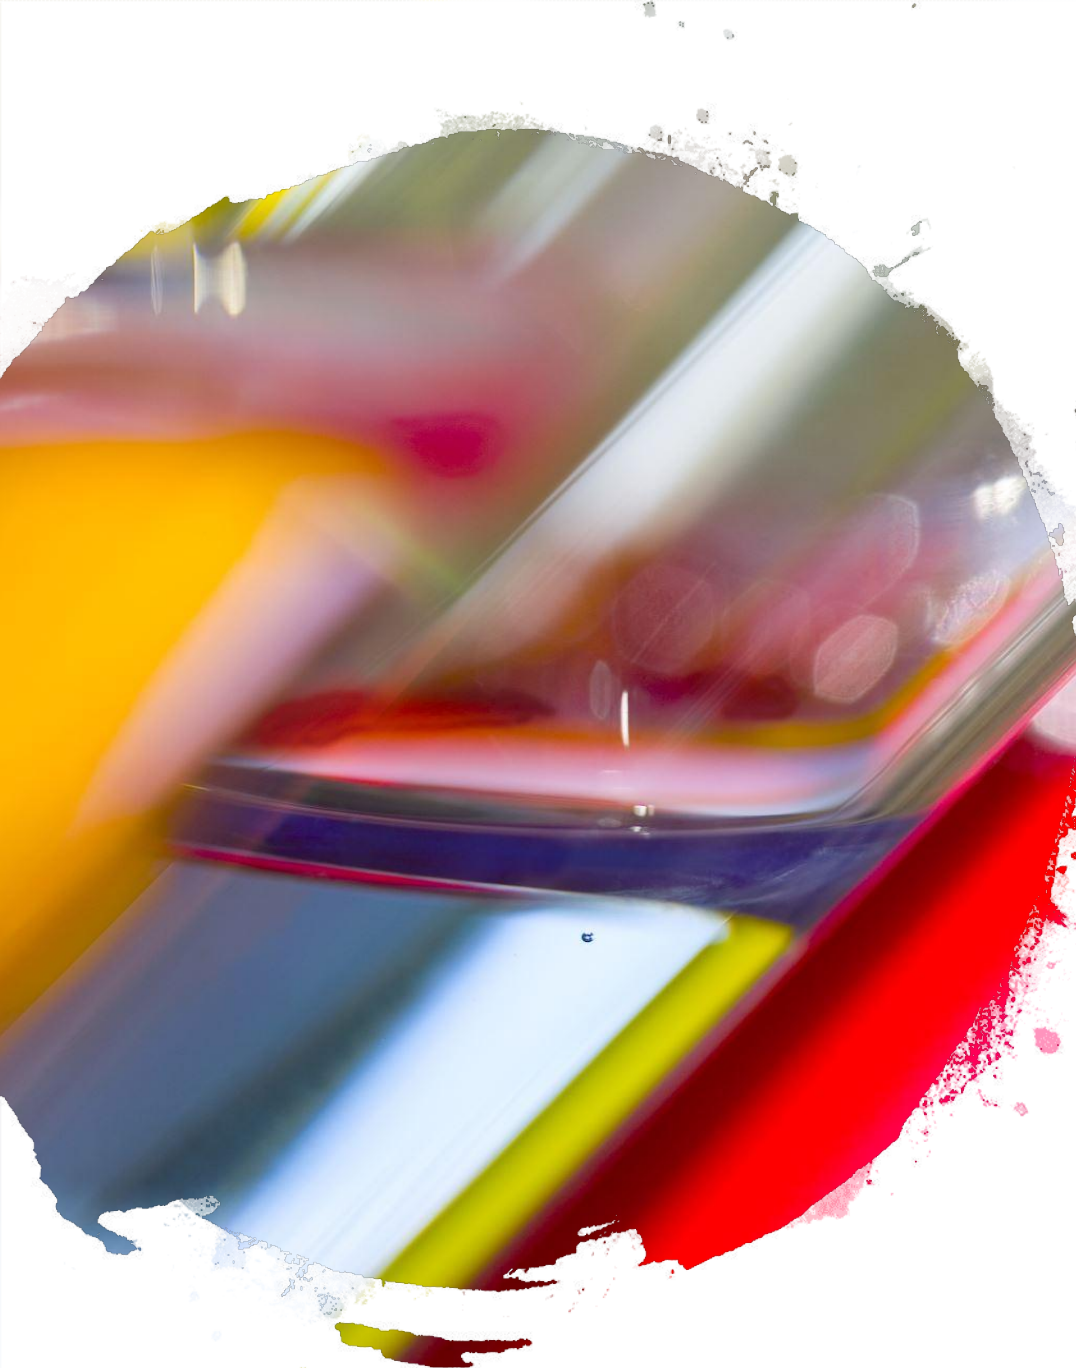

4. Допущения, ограничения и исключения проекта, способные оказать воздействие на реализацию проекта.

Допущения (assumptions) – это факторы, которые для целей планирования считаются верными, реальными или определёнными без предоставления доказательств или демонстрации.

Ограничения (constraints) – это сдерживающие факторы, влияющих на ход исполнения проекта, программы, портфеля или процесса.

Исключения (exceptions) – это пакеты работ, которые в данном проекте выполняться точно не будут, чтоб не раздувать объёмы работ проекта.



5. Высокоуровневые риски (project risks), где указывается:

- насколько компания готова рисковать (т.е. уровни толерантности Спонсора и Заказчика проекта к рискам)
- что или кто может помешать реализации проекта
- как это повлияет на сроки, бюджет, качество и объёмы работ проекта
- даётся краткое описание, каким образом будет осуществляться управление рисками проекта



6. Сводное расписание (schedule, milestones)

контрольных событий (вех), как правило задаваемое контрактом или другими требованиями указывающими, в какие именно сроки должны произойти те или иные вехи проекта, и кто ответственен за их происхождение.

Здесь тоже указываются только высокоуровневые вехи.



7. Заинтересованные стороны проекта, участники проекта (project stakeholders):

- могут влиять на проект
- на которых может влиять проект

- Заказчики\Пользователи
- Спонсор
- Руководители (менеджеры) программ\портфелей
- Проектный офис
- Команда проекта
- Функциональные руководители
- Поставщики, вендоры, бизнес-партнеры



8. Сводный бюджет (project budget), указывающий, во сколько обойдётся проект и сколько денег спонсор проекта готов предоставлять ежемесячно (или ежеквартально, еженедельно, др).

Детальный бюджет, на основе этих данных, будет потом отображён в Базовом плане по стоимости.

9. Руководитель проекта.

Как говорилось выше, это самый важный раздел Устава, который содержит информацию о назначенном Руководителе проекта, его уровне ответственности и полномочий, т.е. кто отвечает за успешную реализацию проекта и что ему для этого необходимо.

Конечно же, рекомендуется, чтобы Руководитель проекта участвовал в разработке Устава проекта, так как данный документ наделяет его полномочиями использовать ресурсы организации для выполнения проекта и ответственностью за достижение целей проекта

SMART-цели: подробный обзор метода


Целеполагание по правилам

Миссия невыполнима.
Мертворожденные проекты



Kick-off Meeting

- ❖ Plan:
 - before: send agenda
 - during: record
 - after: meeting minutes
- ❖ Preliminary Kick-off
- ❖ White shirt
- ❖ Clear Agenda

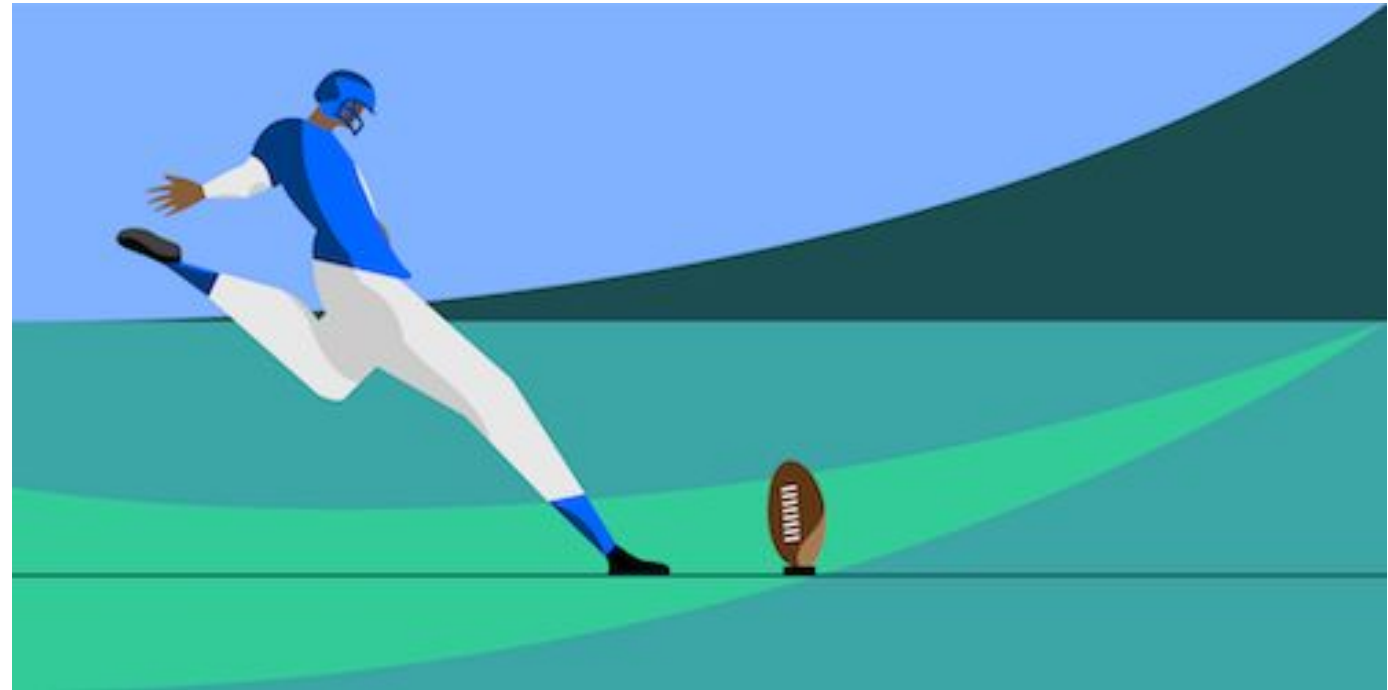

Agenda

- ❖ Project Vision
- ❖ Team roles
- ❖ Communication Plan
- ❖ Project Management
- ❖ Risks and Assumptions
- ❖ Next steps



Your questions during Kickoff

- ❖ Client – what's the background?
- ❖ Project – why are we doing this?
- ❖ Scope – what are we doing?
- ❖ Approach – how are we going to make this happen?
- ❖ Roles – who is doing what?
- ❖ Teamwork – how are we going to work together?
- ❖ Next – how do we keep momentum?
- ❖ Q&A – what haven't we told you?

Практика

Подготовьтесь и проведите kick off для проектов-примеров

Что сделать дома

- почитать PMBok: разработка устава проекта (стр. 75-81)
- почитать PMBok: создание ИСР (стр. 156-161)
- Подготовить письмо заказчику после проведенного kick off звонка по **вашему** проекту
