


НАСТРОЙКА ПРОЦЕССОВ ПРОЕКТА




Process VS Project

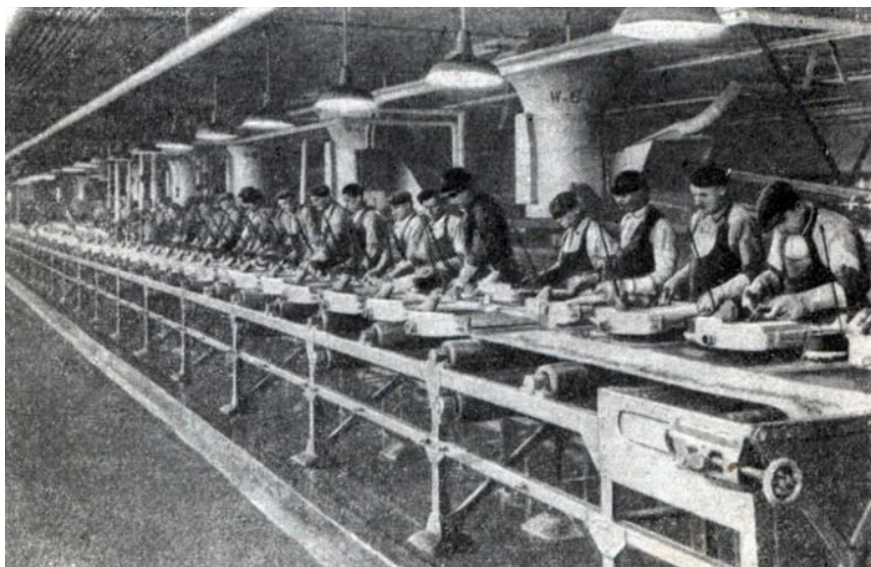

- Time: pace
- Repetitive actions.




- Time: deadline, start, finish
- Unique product

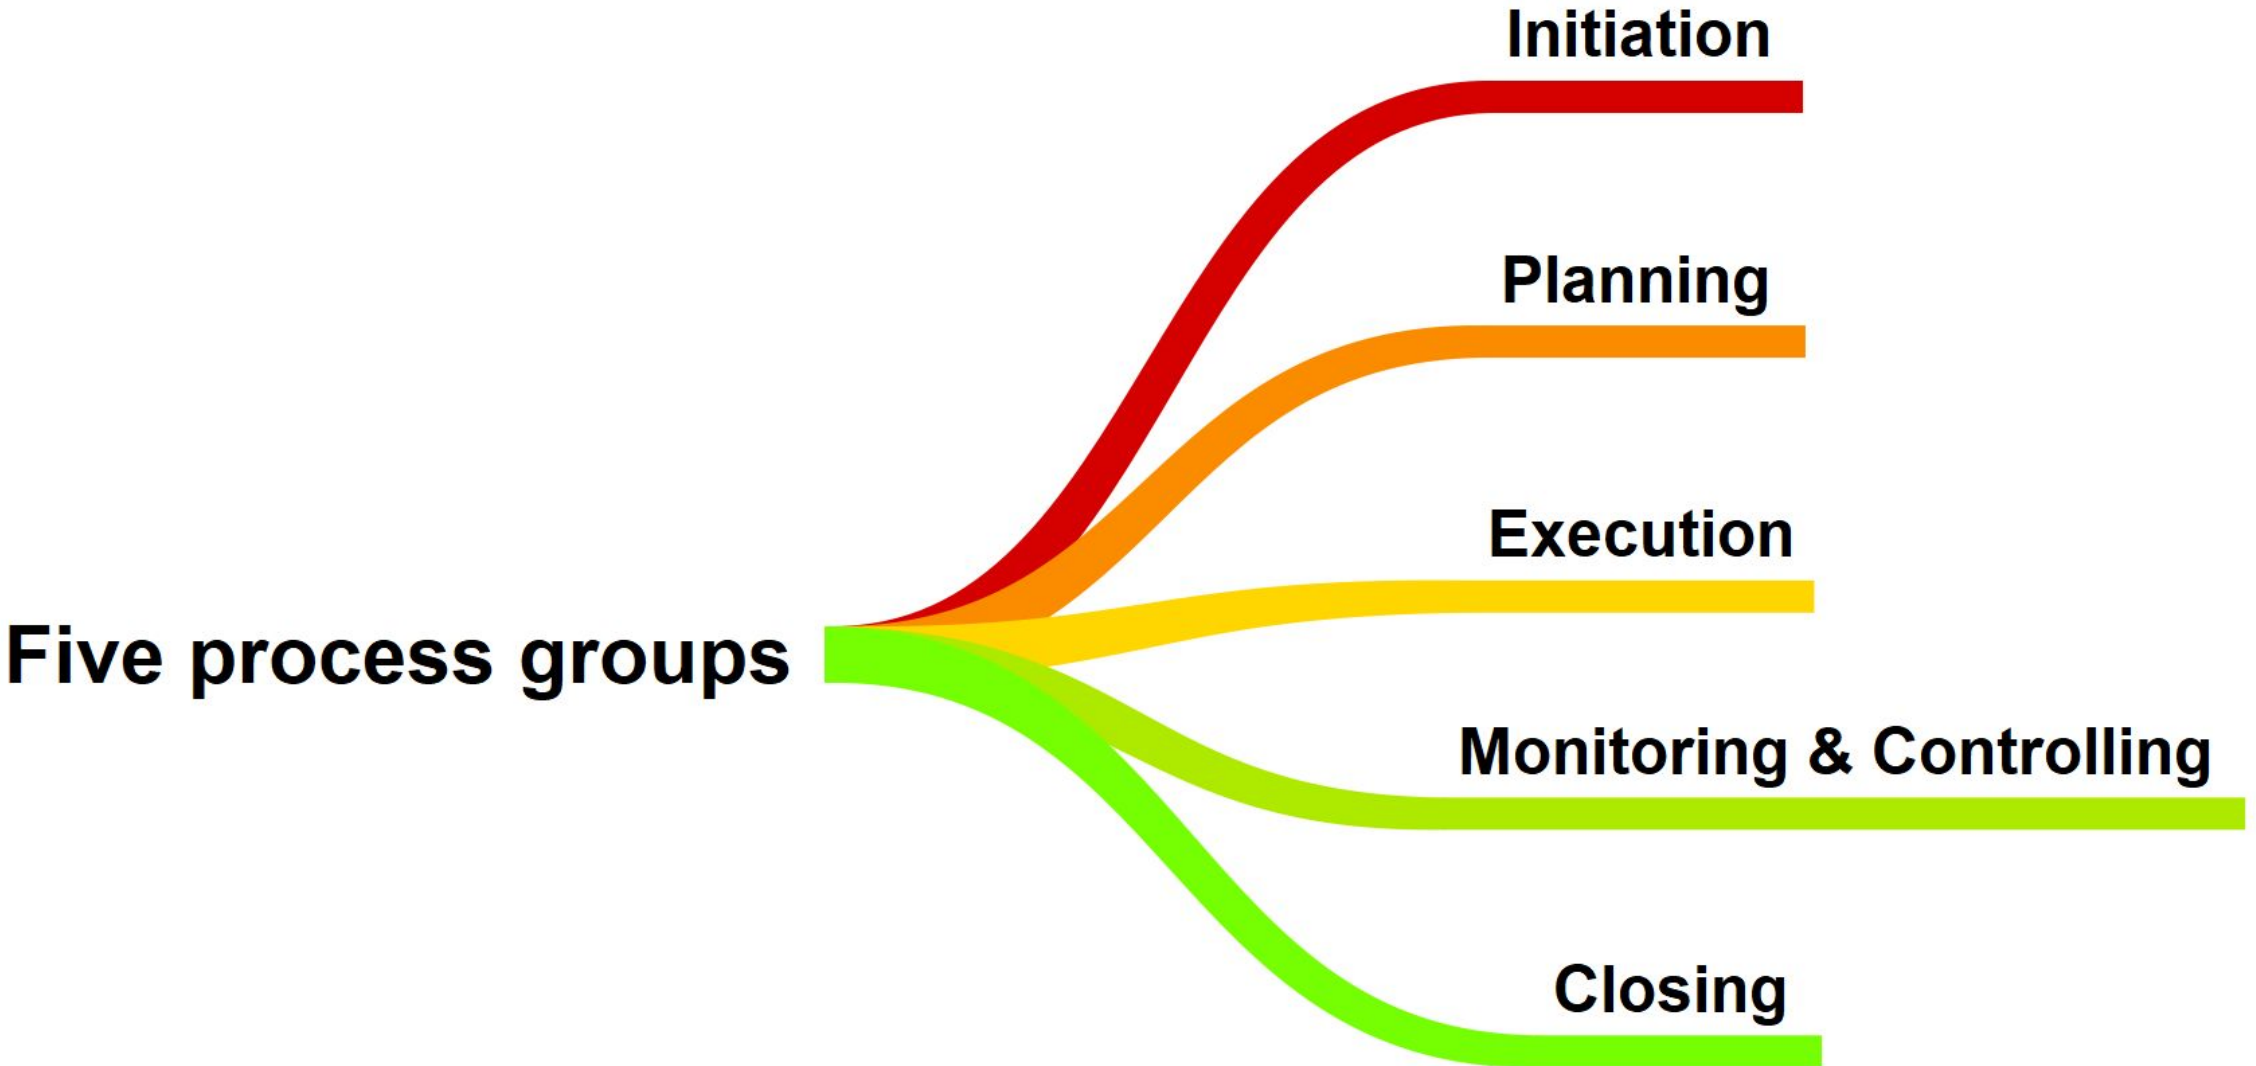

PROCESS GROUP AND KNOWLEDGE AREA MAPPING

Knowledge Areas	Project Management Process Groups				
	Initiating	Planning	Executing	Monitoring and Controlling	Closing
4. Project Integration Management	4.1 Develop Project Charter	4.2 Develop Project Management Plan	4.3 Direct and Manage Project Work 4.4 Manage Project Knowledge	4.5 Monitor and Control Project Work 4.6 Perform Integrated Change Control	4.7 Close Project or Phase
5. Project Scope Management		5.1 Plan Scope Management 5.2 Collect Requirements 5.3 Define Scope 5.4 Create WBS		5.5 Validate Scope 5.6 Control Scope	
6. Project Schedule Management		6.1 Plan Schedule Management 6.2 Define Activities 6.3 Sequence Activities 6.4 Estimate Activity Durations 6.5 Develop Schedule		6.6 Control Schedule	
7. Project Cost Management		7.1 Plan Cost Management 7.2 Estimate Costs 7.3 Determine Budget		7.4 Control Costs	
8. Project Quality Management		8.1 Plan Quality Management	8.2 Manage Quality	8.3 Control Quality	
9. Project Resource Management		9.1 Plan Resource Management 9.2 Estimate Activity Resources	9.3 Acquire Resources 9.4 Develop Team 9.5 Manage Team	9.6 Control Resources	
10. Project Communications Management		10.1 Plan Communications Management	10.2 Manage Communications	10.3 Monitor Communications	
11. Project Risk Management		11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risks 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses	11.6 Implement Risk Responses	11.7 Monitor Risks	
12. Project Procurement Management		12.1 Plan Procurement Management	12.2 Conduct Procurements	12.3 Control Procurements	
13. Project Stakeholder Management	13.1 Identify Stakeholders	13.2 Plan Stakeholder Engagement	13.3 Manage Stakeholder Engagement	13.4 Monitor Stakeholder Engagement	

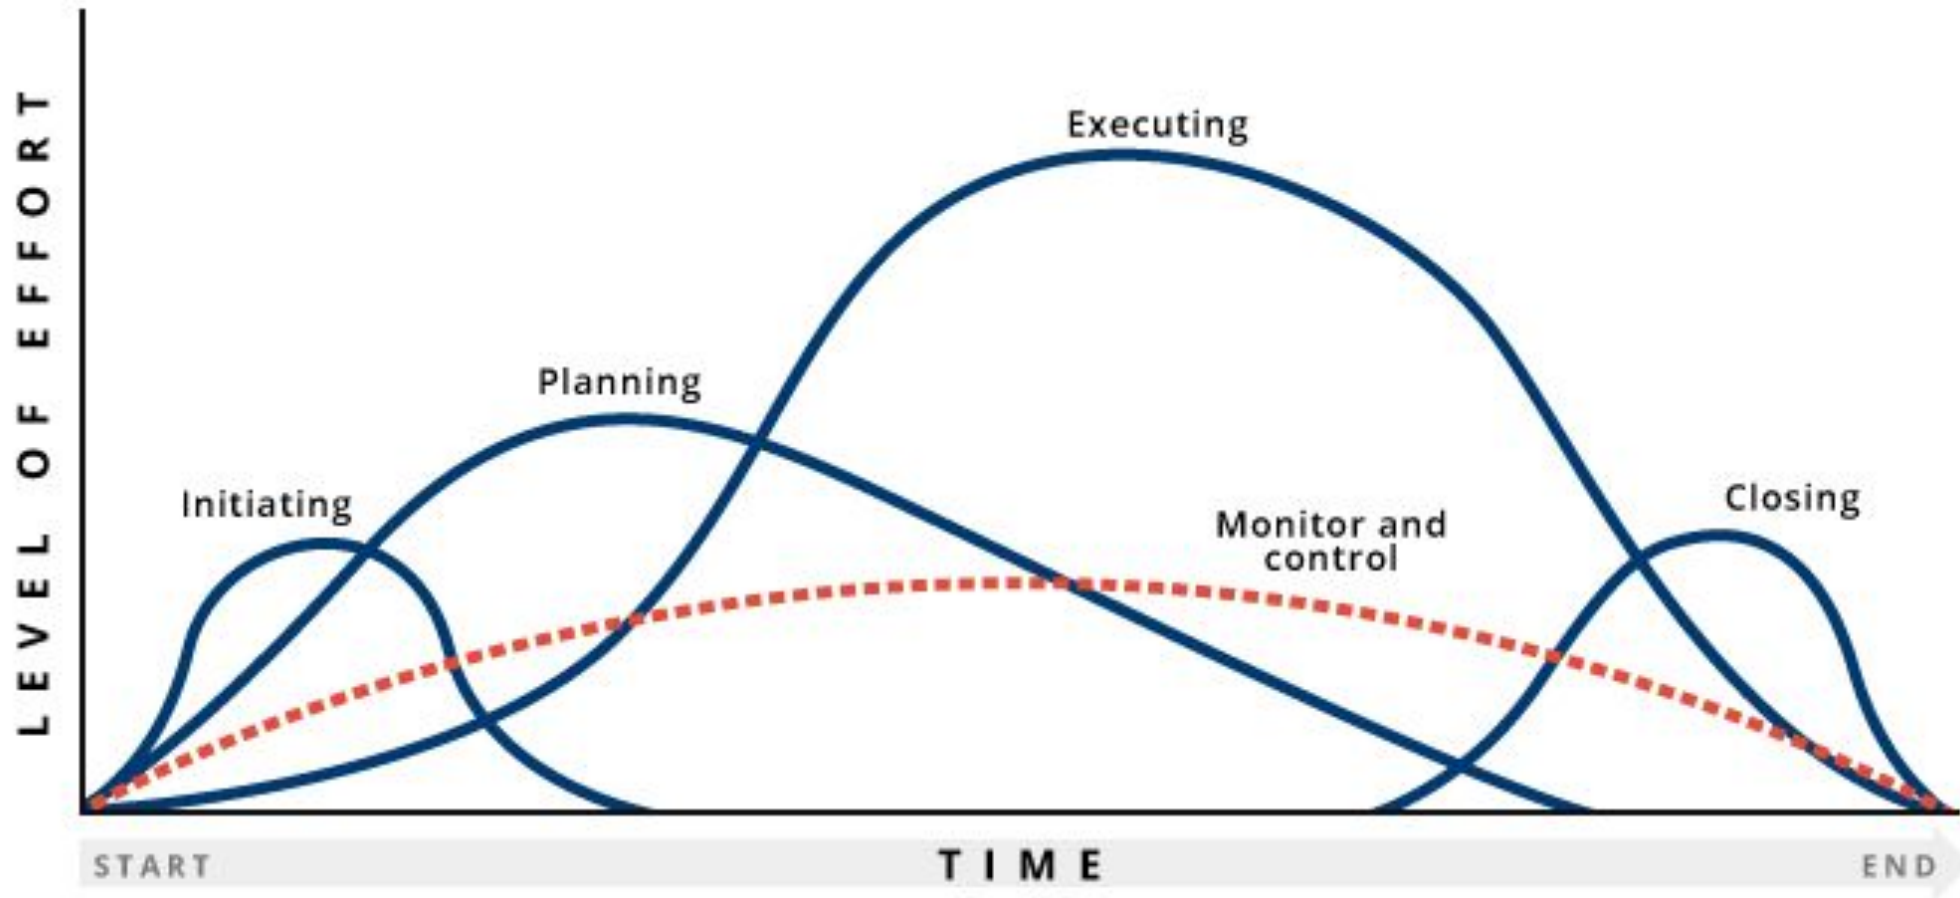



1. Разработка
устава проекта




2. Разработка плана
управления
проектом



3. Управление
знаниями проекта



4. Мониторинг и
контроль работ
проекта



5. Руководство и
управление работами
проекта



6. Интегрированный
контроль изменений



7. Закрытие проекта или
фазы



Управление интеграцией проекта — это сфера деятельности **руководителя проекта**



Ответственность за управление интеграцией проекта **нельзя делегировать** или передать



Руководитель проекта — это лицо, которое обобщает результаты деятельности в других областях знаний и видит общую картину проекта



На руководителе проекта лежит конечная **ответственность** за проект в целом

План управления проектом

- ❖ План управления содержанием
 - ❖ План управления требованиями
 - ❖ План управления расписанием
 - ❖ План управления стоимостью
 - ❖ План управления качеством
 - ❖ План управления ресурсами
 - ❖ План управления коммуникациями
 - ❖ План управления рисками
 - ❖ План управления закупками
-
- ❖ План вовлечения заинтересованных сторон
 - ❖ План управления изменениями
 - ❖ План управления конфигурациями
 - ❖ Базовый план по содержанию
 - ❖ Базовый план по стоимости
 - ❖ Базовый план исполнения
 - ❖ Описание жизненного цикла проекта
 - ❖ Подход к разработке






1. Разработка
устава проекта




2. Разработка
плана
управления
проектом



3. **Управление
знаниями
проекта**



4. Мониторинг и
контроль работ
проекта



5. Руководство и
управление
работами проекта



6. Интегрированный
контроль изменений



7. Закрытие проекта
или фазы

Составляющие систем управления знаниями

Базы извлеченных уроков (lessons learned)

Определение местонахождения компетенций (expertise location)

Сообщества специалистов-практиков (communities of practice)

Управления знаниями проекта



ПРОЕКТНЫЕ
АРТЕФАКТЫ



ЗНАНИЯ
О ДВИЖЕНИИ
ПРОЕКТА



ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ
ОПИСАНИЯ



НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

Точки формирования **знаний** о **движении** проекта:

Демо — представление состояния проекта.

Ретро — оценка себя.

Daily meeting — синхронизация команды.


Планирование — синхронизация намерений.



1. Разработка
устава проекта




2. Разработка
плана
управления
проектом



3. Управление
знаниями
проекта



**4. Мониторинг и
контроль работ
проекта**



5. Руководство и
управление
работами проекта




6. Интегрированный
контроль изменений



7. Закрытие проекта
или фазы



Мониторинг - это сбор, измерение и оценка измерений и тенденций для оказания воздействия на улучшение процесса.



Насколько удалось решить проблему с помощью корректирующих действий?

сравнение факта и плана

требуется ли
корректирующие
действия?

проверка статуса
отдельных рисков

поддержание
информационной базы
продукта

помогает с отчетами и
прогнозированием

обновление текущих
стоимости и расписания

мониторинг реализации
одобренных изменений

отчеты о статусе
руководству программы

согласование проекта с
бизнес-потребностями

- ❖ Minimize changes to the initial plan
- ❖ Recommend corrective actions
- ❖ Work with change requests
- ❖ Constantly check plan versus actual

Monitoring and
Controlling
(in a nutshell)



1. Разработка
устава проекта




2. Разработка
плана
управления
проектом



3. Управление
знаниями
проекта



4. Мониторинг и
контроль работ
проекта



5. Руководство и
управление
работами проекта



6. Интегрированный
контроль изменений



**7. Закрытие
проекта или фазы**

Группа процессов закрытия

1. Действия и мероприятия, необходимые для удовлетворения **критериев завершения** или выхода для фазы или проекта
2. Мероприятия, связанные с завершением **договорных соглашений**
3. Мероприятия, необходимые для сбора документации проекта или фазы проекта, проведения аудиторской проверки с целью **подтверждения успеха** или неудачи проекта
4. Действия и мероприятия, необходимые для **передачи продуктов**, услуг или результатов проекта в следующую фазу или в производство и/или операционную деятельность
5. **Сбор предложений** по совершенствованию или внесению изменений в политики и процедуры организации и их передача в соответствующее организационное подразделение
6. Измерение **удовлетворенности** заинтересованных сторон

- ❖ Ensure all work is completed
- ❖ Close project or phase contracts
- ❖ Archive project documents and environment
- ❖ Once the project is closed, the customer is responsible for further changes
- ❖ Agree on next steps (i.e. maintenance)

Closing
(in a nutshell)



Phase	Fundamental Scrum Processes
Initiate	1. Create Project Vision 2. Identify Scrum Master and Stakeholder(s) 3. Form Scrum Team 4. Develop Epic(s) 5. Create Prioritized Product Backlog 6. Conduct Release Planning
Plan and Estimate	7. Create User Stories 8. Estimate User Stories 9. Commit User Stories 10. Identify Tasks 11. Estimate Tasks 12. Create Sprint Backlog
Implement	13. Create Deliverables 14. Conduct Daily Standup 15. Groom Prioritized Product Backlog
Review and Retrospect	16. Demonstrate and Validate Sprint 17. Retrospect Sprint
Release	18. Ship Deliverables 19. Retrospect Project

Agile



Что сделать дома

- **полистать** PMBok (с.541-638)
- освежить в памяти знания о создании схем бизнес процессов (3 статьи)
- закончить с Project Charter
